



MUNICIPIO DE LUJÁN

**INFORME
AVANCE DE LA OBRA
DE AGUA POTABLE
EN PUEBLO NUEVO**



ETAPAS DE LA OBRA

ETAPA 1

- Trabajos preliminares ✓
- Excavaciones ✓
- Tendido de colectores principales ✓

ETAPA 2


- Tendido de colectores secundarios ✓
- Prueba hidráulica lineal ✓
- Refacciones de veredas y calzadas
Finalización en 15 días
- Colocación de tanque y prueba hidráulica general
Finalización Tercera semana de noviembre

ETAPA 3

- Tendido de redes de distribución domiciliarias
En proceso de Licitación

ETAPA 4

- Conexiones de las redes a los domicilios y refacciones de veredas
En proceso de Licitación

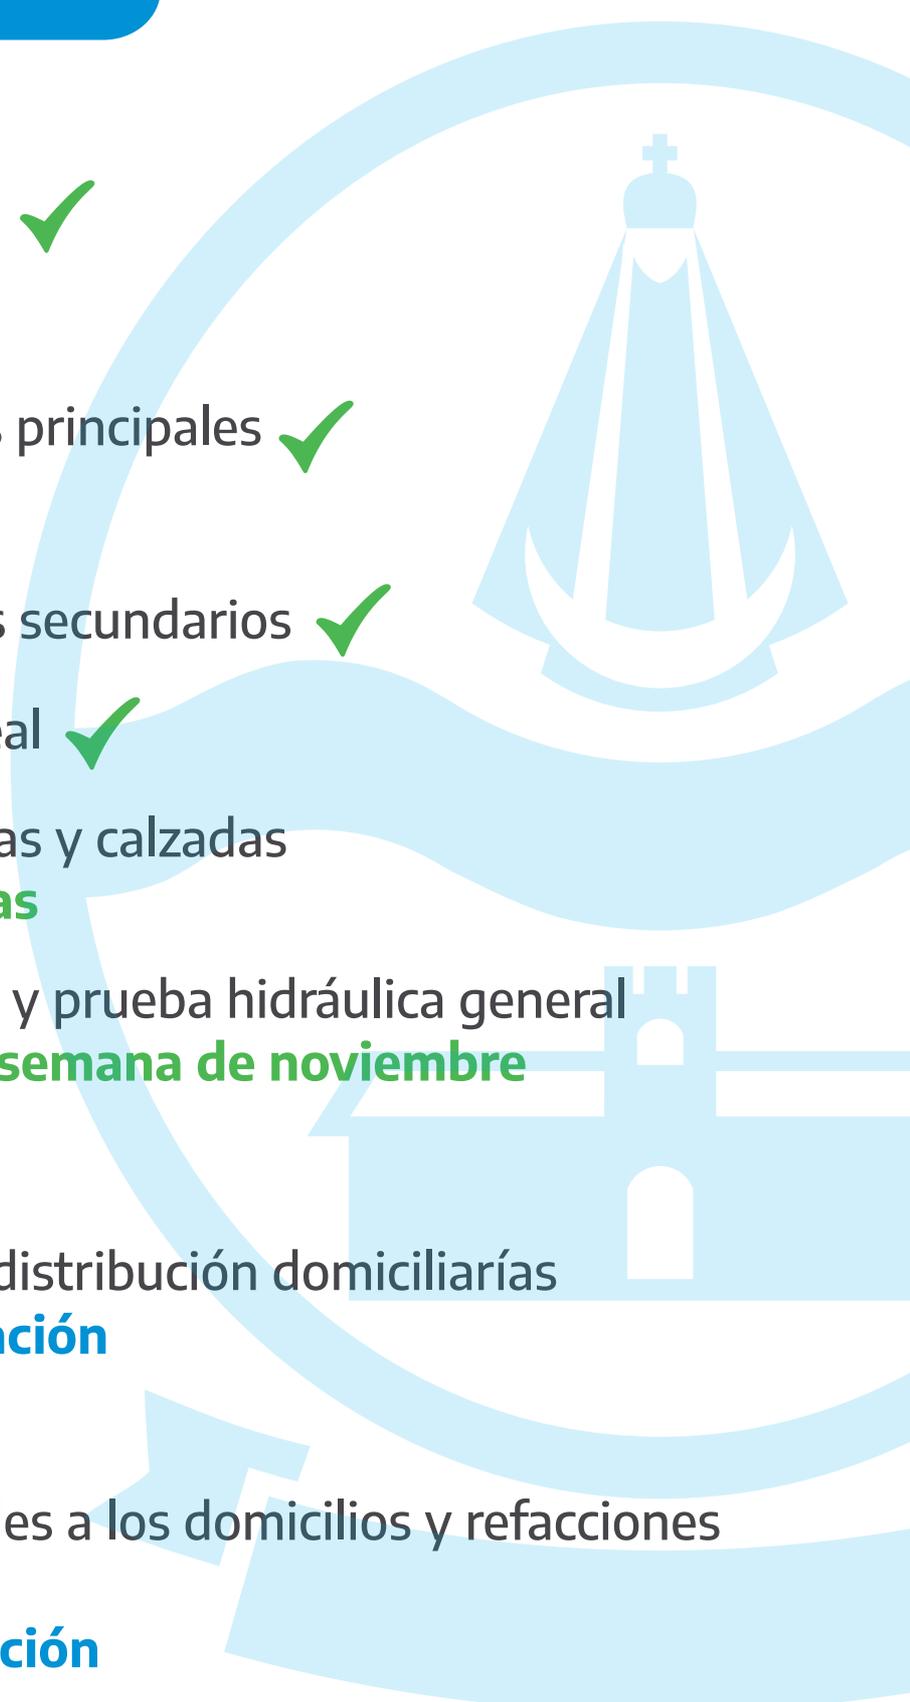



AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE AGUA





RESULTADO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE

| ELEMENTO EVALUADO | RESULTADO | LIMITES |
|----------------------------|--------------|-------------|
| ○ Cromo | <0,02 mg/l | 0,05 mg/l |
| ○ Mercurio | <0,0005 mg/l | 0,001 mg/l |
| ○ PH | 7,70 UpH | 6,5 a 8,5 |
| ○ Sólidos conductimétricos | 621 mg/l | 1500 mg/l |
| ○ Alcalinidad tot. | 355 mg/l | --- mg/l |
| ○ Dureza tot. | 63 mg/l | --- mg/l |
| ○ Cloruros | 10 mg/l | 250 mg/l |
| ○ Sulfatos | 13 mg/l | 250 mg/l |
| ○ Hierro | 0,1 mg/l | 0,30 mg/l S |
| ○ Nitratos | 37 mg/l | 50 mg/l |
| ○ Nitritos | 0,01 mg/l | 3,00 mg/l |
| ○ Nitrógeno amoniacal | 0,08 mg/l | 0,2 mg/l |
| ○ Plomo | <0,01 mg/l | 0,01 mg/l |
| ○ Arsénico | 0,03 mg/l | 0,05 mg/l |
| ○ Fluoruros | 1,00 mg/l | 1,5 mg/l |

Laboratorio Rios: Habilitado por la Secretaría de Política Ambiental
s/ley Dec 1.443/00 Res. 504/01 Habilitación N° 97 de OPDS




REPARACIONES

REALIZADAS

- Calle Tropero Moreyra ✓
- Calle Estrada ✓
- Calle Rio Luján ✓
- Cruces de calles Rio Luján y Estrada ✓
- Cruce por Tropero Moreyra y Calles Catalpas, Acacias, Los Tilos, Los Platanos ✓
- Cruces por calles Las Tipas, entre Estrada y Torres. ✓

HORMIGON UTILIZADO: 10mts Cubicos
ASFALTO UTILIZADO: 25 Toneladas






REPARACIONES

PENDIENTES

- Calle 8 de Diciembre (Frentes)
- Calle Tropero Moreyra (Frentes)
- Cruce 8 de Diciembre y Platanos
- Cruce de Tropero Moreyra y Sophoras
- Cruce 8 de Diciembre y Sophoras
- Cruce 8 de Diciembre y Los Tilos
- Cruce de Tropero Moreyra y Los Tilos
- Cruce las Acacias y Tropero Moreyra
- Cruce 8 de Diciembre y Maria Berón
- Cruce de Tropero Moreyra y Catalpas
- Cruce las Acacias y 8 de Diciembre
- Cruce 8 de Diciembre e Isidro Salvador
- Cruce Catalpas y 8 de Diciembre

Proyección: primeros 15 días de noviembre

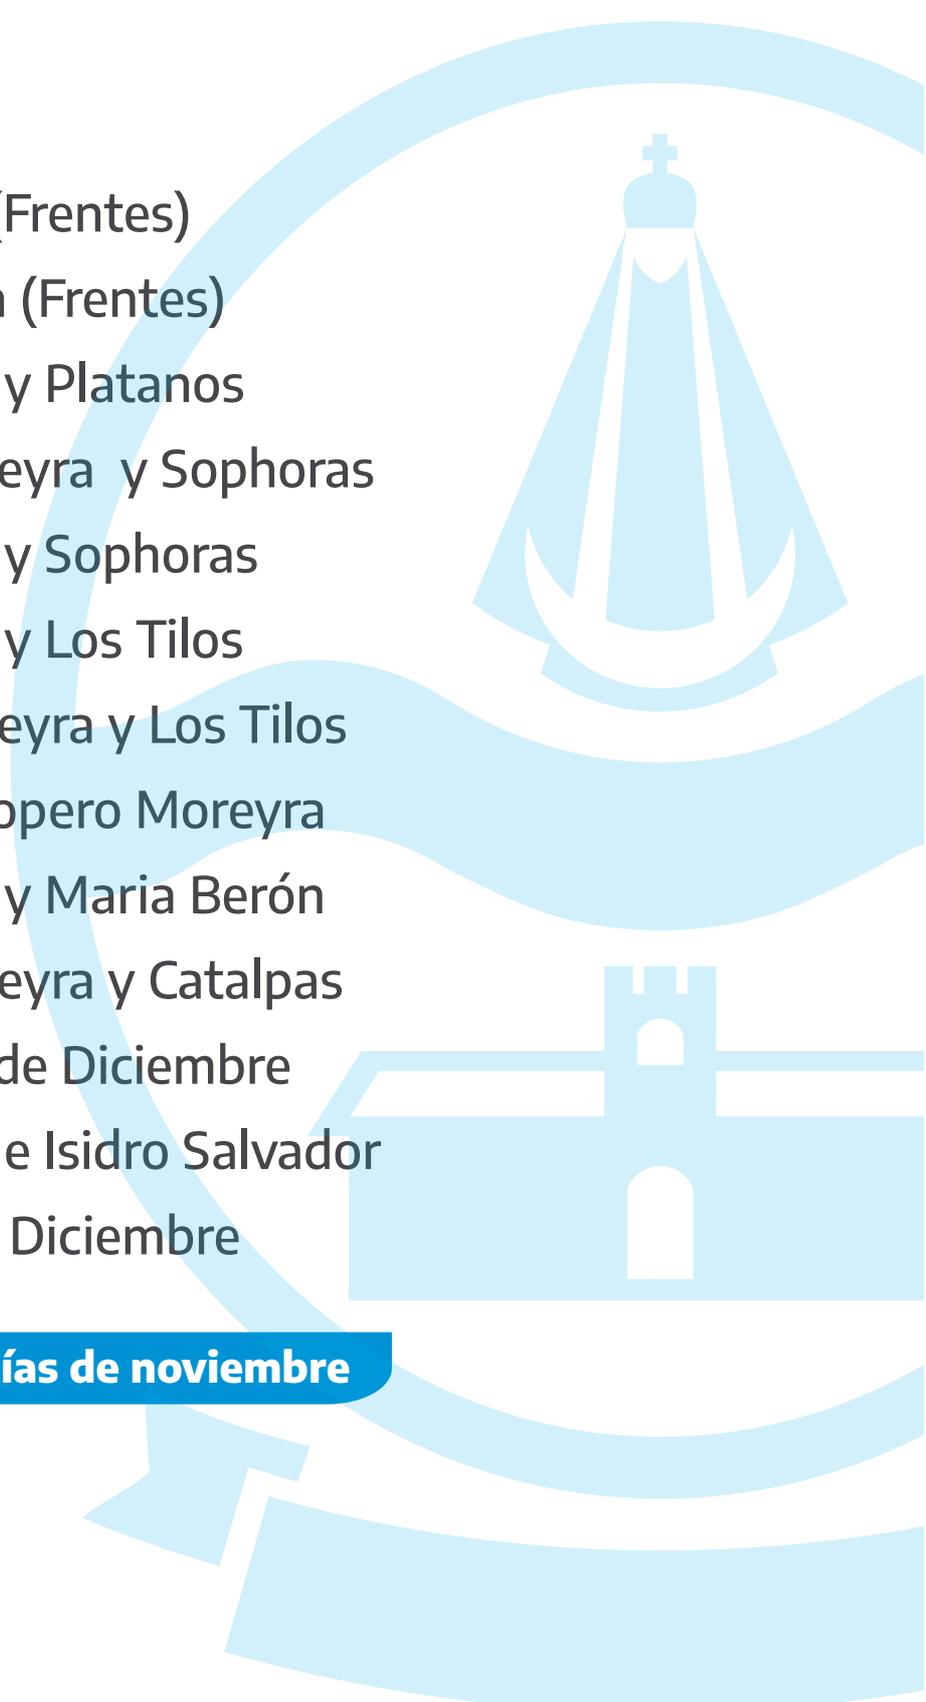

ENOHSA



MUNICIPIO DE LUJÁN
INTENDENTE **LEONARDO BOTO**
